


双葉町における 除染解体工事の進捗について

令和2年7月22日 環境省 福島地方環境事務所



双葉町内における除染等工事の実施状況

図に示すほか、主要道路、双葉町役場、厚生病院一帯、駐在所、双葉中学校、双葉高校、コミュニティセンター、携帯電話基地局、墓地等については、2013～17年度に順次実施

再生可能エネルギー活用・農業再生ゾーン
→除染中(令和2年5月～)

避難指示解除準備区域
(解除済区域)


耕作再開モデルゾーン
→除染中(令和元年5月～)

双葉駅西地区
→除染済(平成28～29年度)

まちなか再生ゾーン(南側)
→除染中(令和2年5月～)

新産業創出ゾーン
→除染中(令和元年10月～)

双葉駅東地区
→除染中(平成29年度末～)

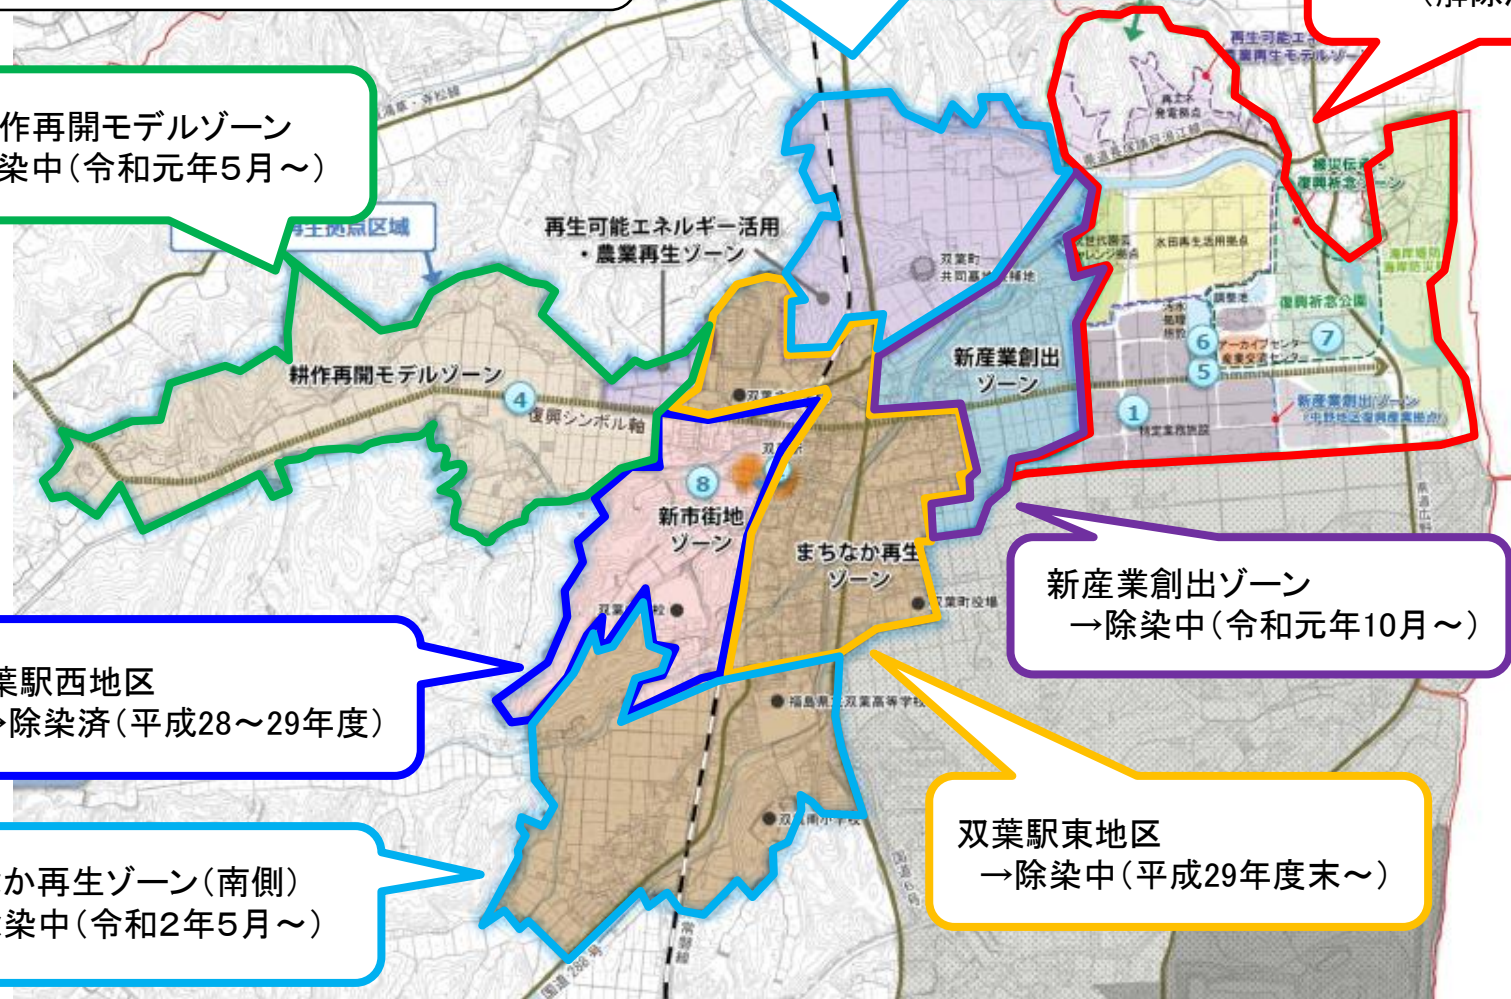

○除染関係

- ・ 双葉駅西地区：同意取得率95.8% 除染完了
- ・ 双葉駅東地区：同意取得率88.7% 除染中
- ・ 耕作再開モデルゾーン：同意取得率95.3% （全農地約75ha中）約50ha農地除染完了,引渡済み
- ・ 新産業創出ゾーン：同意取得率91.5% 農地除染中
- ・ 再生可能エネルギー活用・農業再生ゾーン：同意取得率91.2% 農地除染中
- ・ まちなか再生ゾーン（南側）：同意取得率87.9% 農地除染中

○解体関係

解体申請数892件 解体完了数647件 （5月末時点）



除染・解体工事のスケジュールについて

		平成29年度	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度
			前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
除染	双葉駅西地区 (除染完了)	→									
	双葉駅東地区		→						→		
	耕作再開モデルゾーン					→					
	新産業創出ゾーン				◎ 組合設立・ 農地利用確認	→					
	まちなか再生ゾーン (南側) 再生可能エネルギー活用 ・農業再生ゾーン					◎ 組合設立・ 農地利用確認	→				
	事後モニタリング フォローアップ									→	
解体			→								

駅周辺の避難指示解除・拠点区域の立入規制緩和

拠点区域全域の避難指示解除 (目標)

(令和2年7月時点の案であり状況により変更する可能性があります。)

※未同意画地及び申請者都合により解体できない建物等を除く
